

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Přístavba ZŠ v Praze Lipencích**

Číslo stavby: **02002070**

Pořadové číslo změnového listu:

29



Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu: AR-ST	Název: Úpravy povrchů
Popis změny: Doplnění stěny pro vyrovnání ozubu mezi betonovou konstrukcí a zděnou stěnou. Doplnění nadpraží - skrytí montážních kotev na stropu u zadního vchodu. Opravy omítek po sekání kabelů silnoproud, MaR z důvodu změny PD.		
Zdůvodnění změny: Nesoulad mezi statikou a stavební částí. Pozdní dodání projektu elektro, nový projekt MaR.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing.arch. Peter Jurášek City Work, s.r.o.		Posouzení změny - konzultant: TBI - 

Stavba:	Přístavba ZS v Praze Lipencích	Číslo stavby:	02001880	SO	AR-ST	Změnový list č:	29
Dopady:	do projektové dokumentace:		bez dopadu na PD				
	do časového plánu:		nepředpokládají se				
	do ceny:	zvýšení o:	222 235,00 Kč				
		snížení o:	Kč				
Navrhovatel změny - firma, jméno:	Subterra a.s.		Podpis:				
Subterra a.s.	zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45399612 (094)						
Vyjádření zhotovitele:			Podpis:				
Vyjádření objednatele -			Podpis:				
Doporučení:	<i>30.4. 2019</i>		Podpis:				
Závěrečné stanovisko:							

V Praze dne:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ v Praze - Lipencích

Objekt:

AR a ST část

Místo:

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel:

MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

Projektant:

City Work s.r.o., Na
Baště Sv. Jiří 258/7,
Praha 6

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

222 235,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba ZŠ v Praze - Lipencích

Objekt:

AR a ST část

Místo:

Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel:


MČ Praha - Lipence, K obci 47, Praha - Lipence

Projektant:


City Work s.r.o., Na Baště Sv.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							222 235,00
D			Zadní vstup a krček - úpravy				55 875,00
D							
110	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm vnější stěna stará budova u zadního vstupu 4,2*3,6 nadpraží zadní vstup 3,47*0,4	m2	16,508 15,120 1,388	605,00	9 987,00
118	M	283760320	deska fasádní polystyrénová EPS GreyWall 1000 x 500 x 40 mm	m2	1,527	78,70	120,00
194	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	16,632	248,00	4 125,00
125	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	33,280	339,00	11 282,00
50	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC (4,4-2,7)*3,3*0,45	m3	2,524	5 082,00	12 827,00

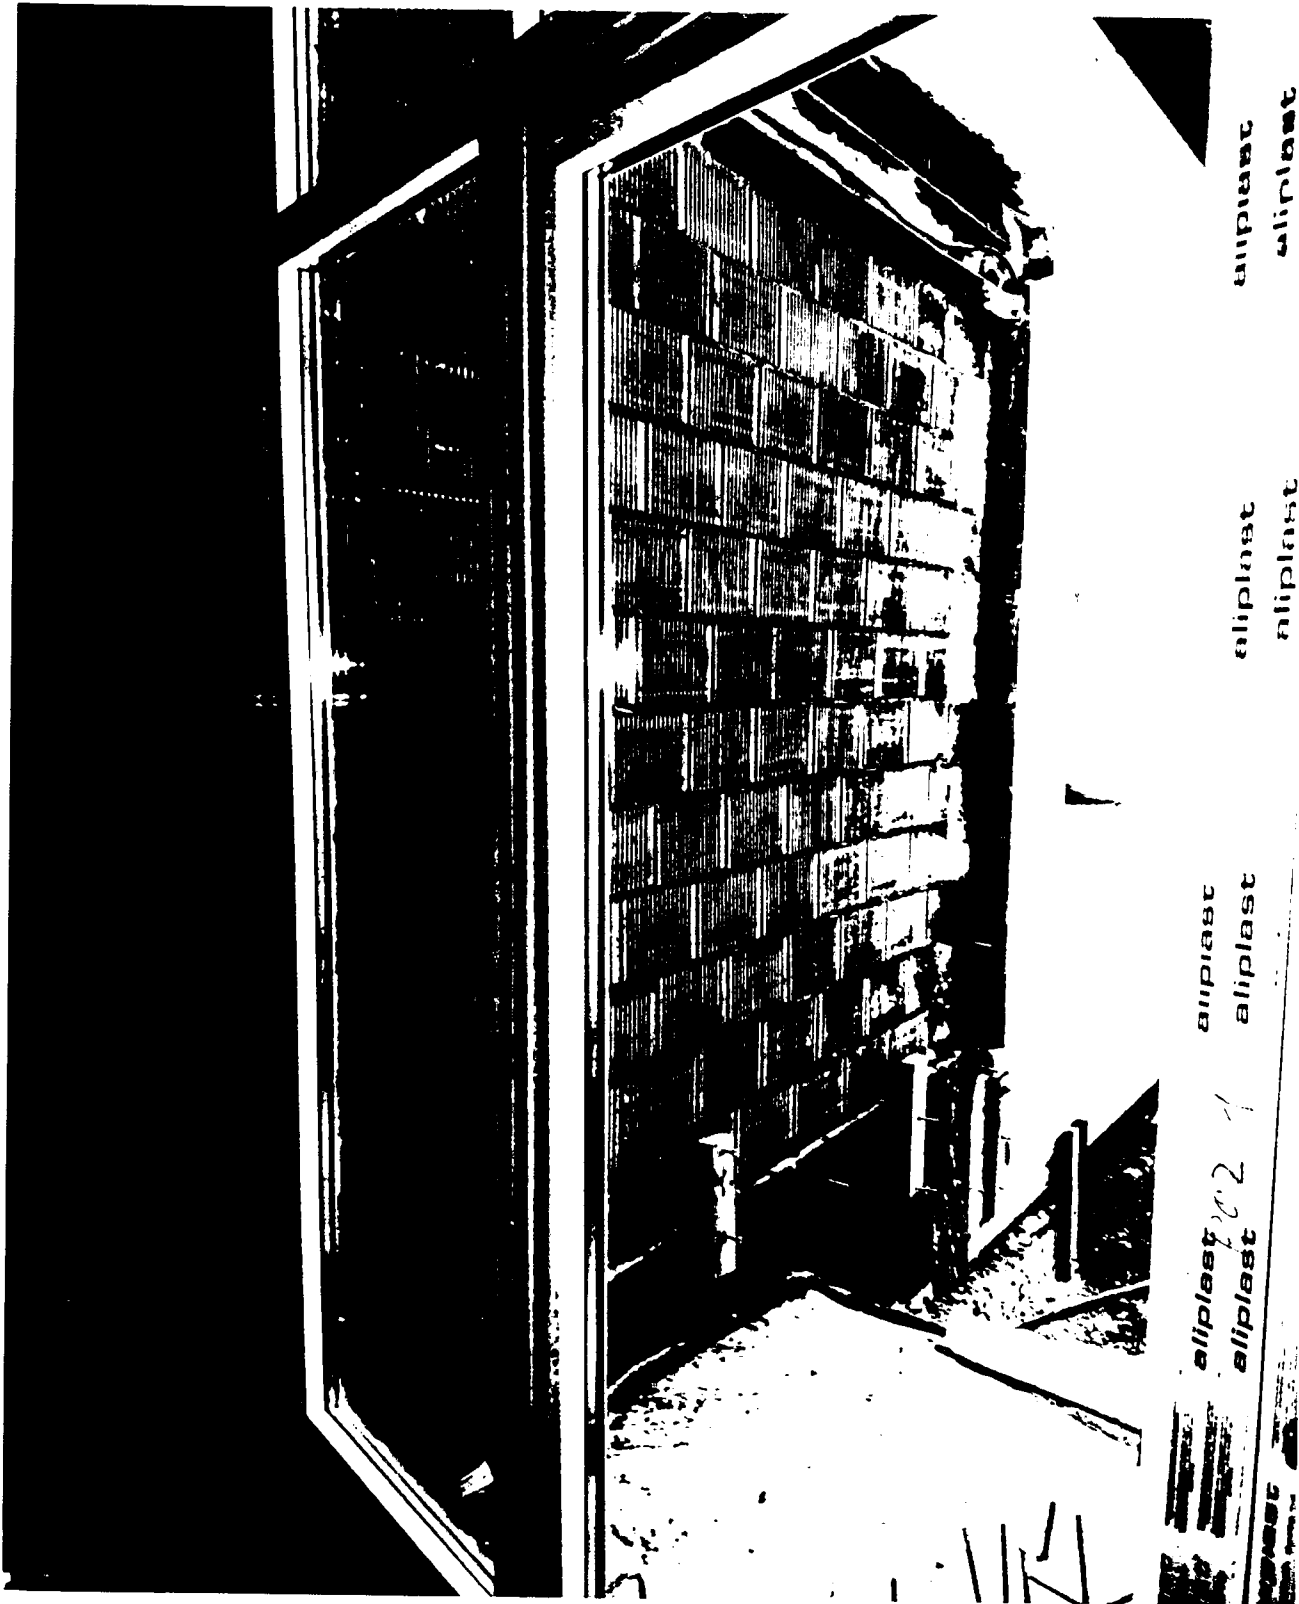


Dozdívka a zateplení u zadního vstupu

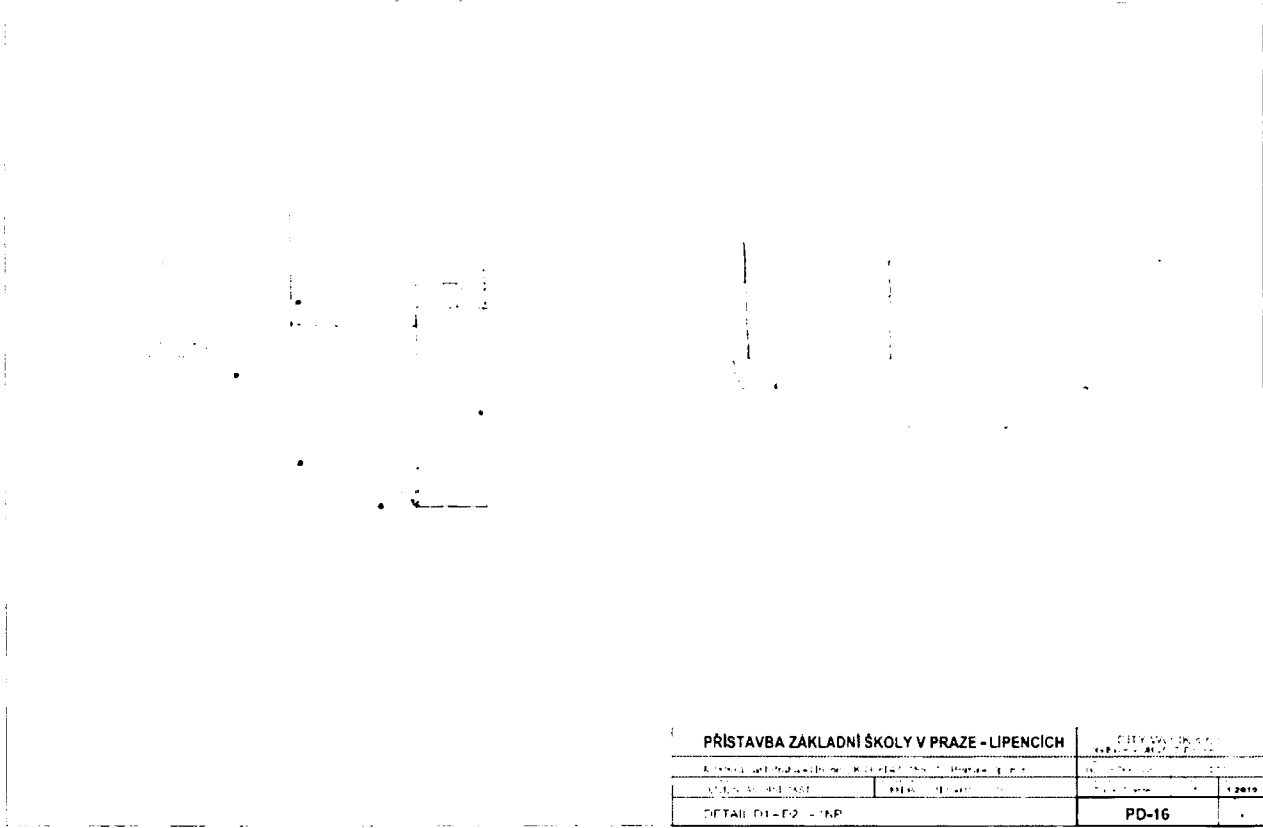



PŘÍSTAVBA ZAKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE - LIPENCÍCH		DITTA ARCHITECT	
Adresa: Lipencův náměstí 1, Praha 1 - Lipence		Objekt: Základní škola	Číslo: 101
Architekt: DITTA ARCHITECT	Stupeň: Podrobný výkres	Číslo: 101	1.2019
DETAIL 01-02 - NP		PD-16	-

Dozdívka u předního vstupu

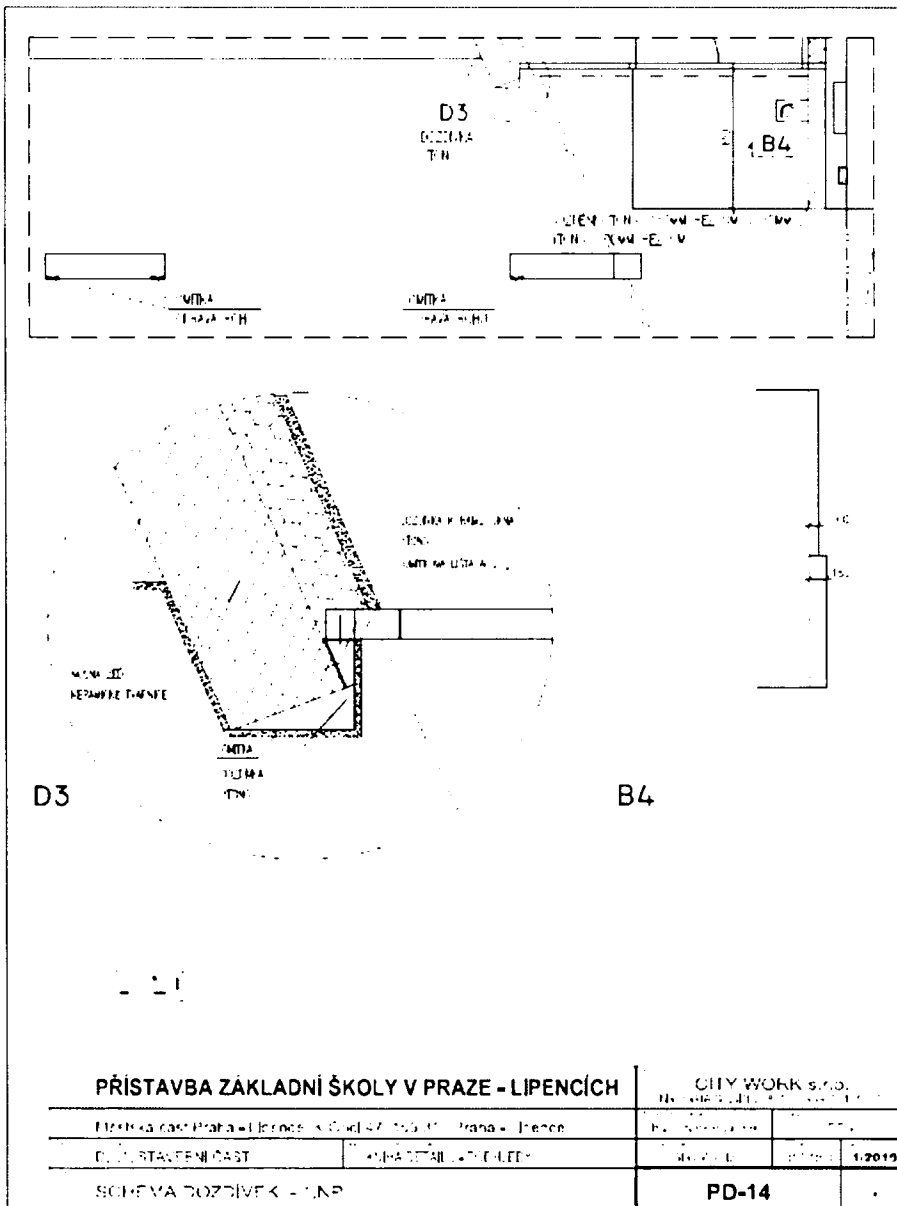

Dozdívka u zadního vchodu směrem k výtahu

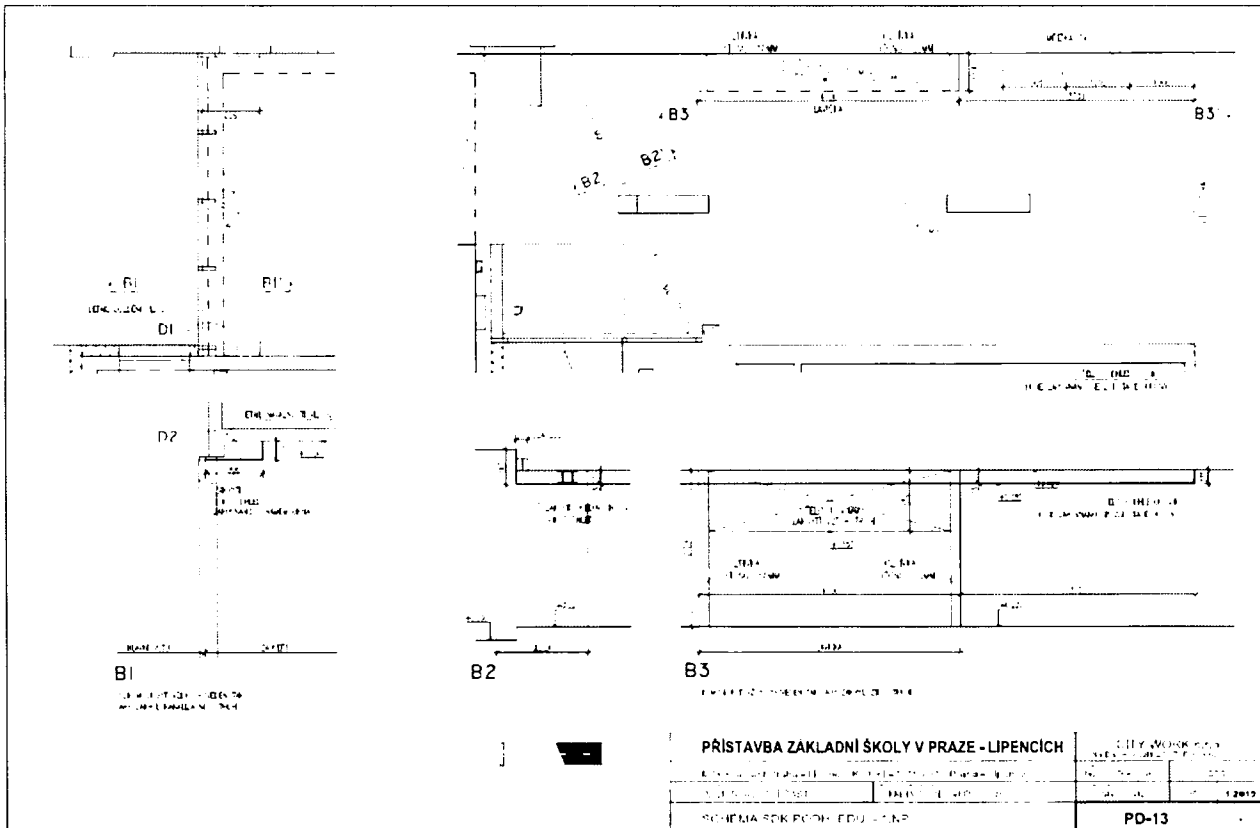

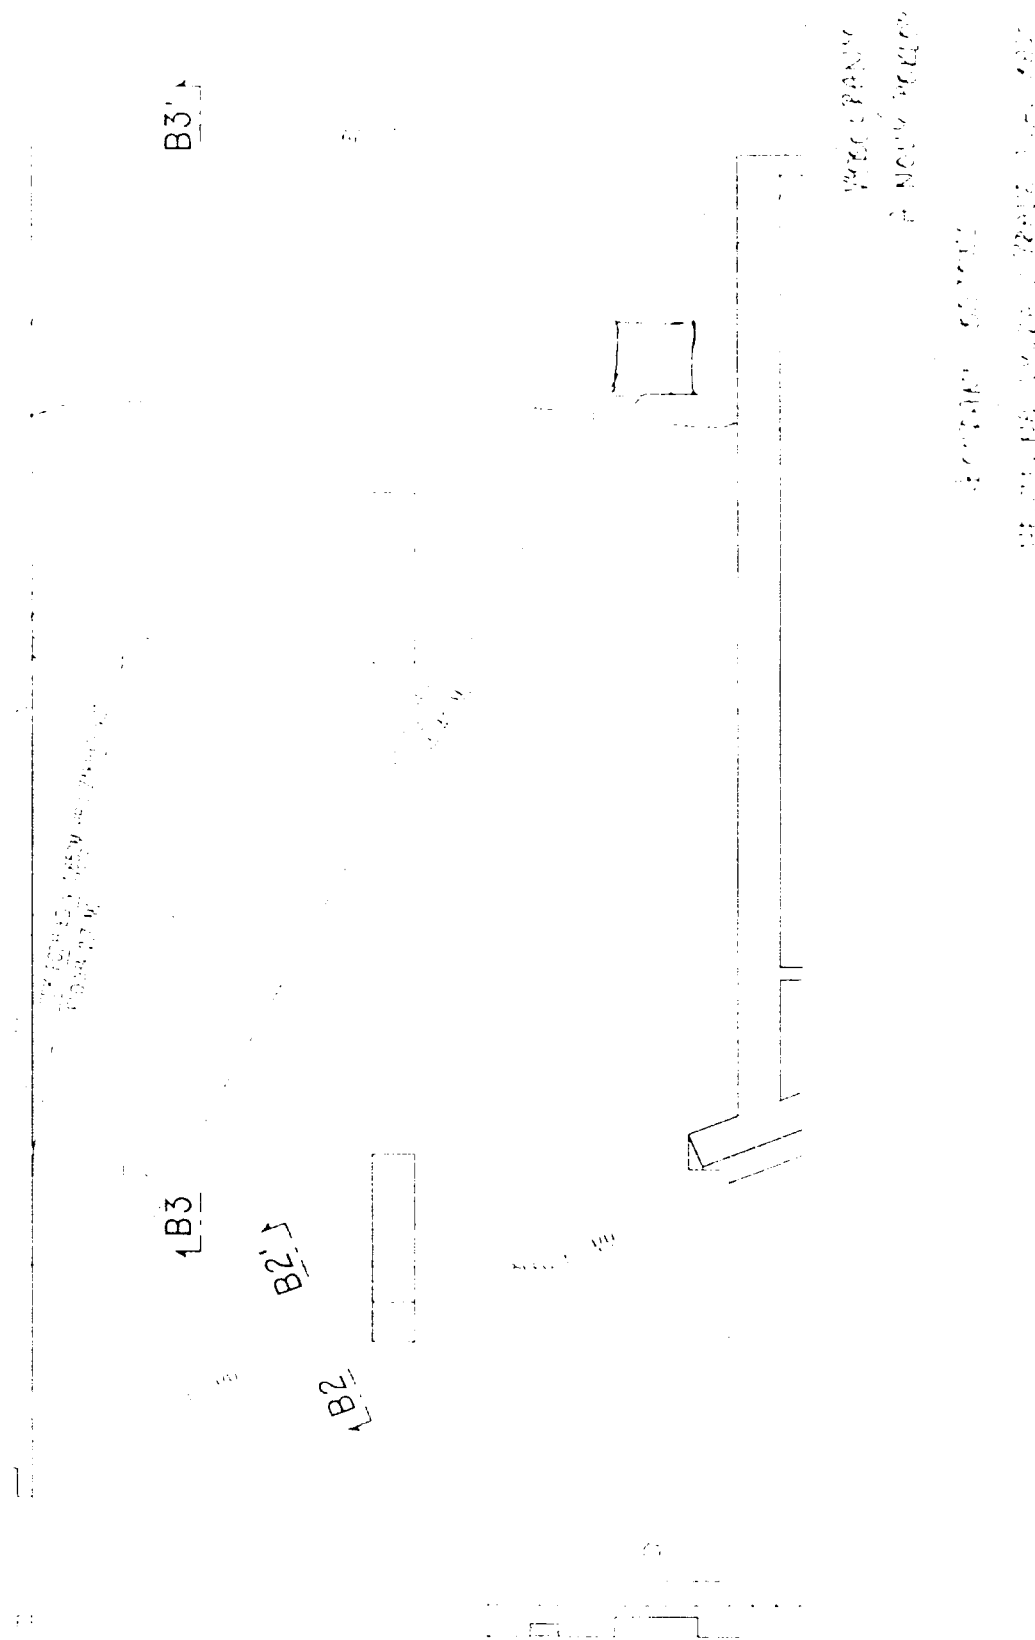

B3

B3

B2

B2

KANTINA
KANTINA

KANTINA

KANTINA
